

# Modernisation RN2

## Section Paris Soissons

### Programmation 2009-2014

Réunion de suivi  
du 7 janvier 2011



Ressources, territoires et habitats  
Énergie et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent  
pour  
l'avenir

# Achèvement du Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 prorogé 2008

- Déviation de Nanteuil le Haudouin	21,00 M€
- Villers Cotterêts, Maître passage faune	3,40 M€

# Programme de modernisation des itinéraires du réseau routier national 2009-2014

- Doublement liaison Le Plessis-B. / Nanteuil-le-H.	20,00 M€
- Déviation de Gondreville	28,00 M€
- Déviation de Vaumoise	27,00 M€
- Déviation de Villers-Cotterêts	16,00 M€
- Sécurisation forêt Retz (partie est du massif)	13,00 M€
- Giratoire RN2/RD1044	0,90 M€
	<b>104,90 M€</b>
- <i>Montant global du PDMI 2009-2014</i>	<i>147,50 M€</i>






**Liaison Le Plessis-Belleville  
Nanteuil le Haudouin  
20 M€ 2009 – 2012  
(Plan de relance)**

**Déviation  
Nanteuil-le-Haudouin  
21 M€ 2008 - 2012**

# Mise à 2 x 2 voies de la RN2 (7 km)

- Rétablissement RD548 (LPB)
- Requalification des échangeurs RD148 et 136 (NLH)

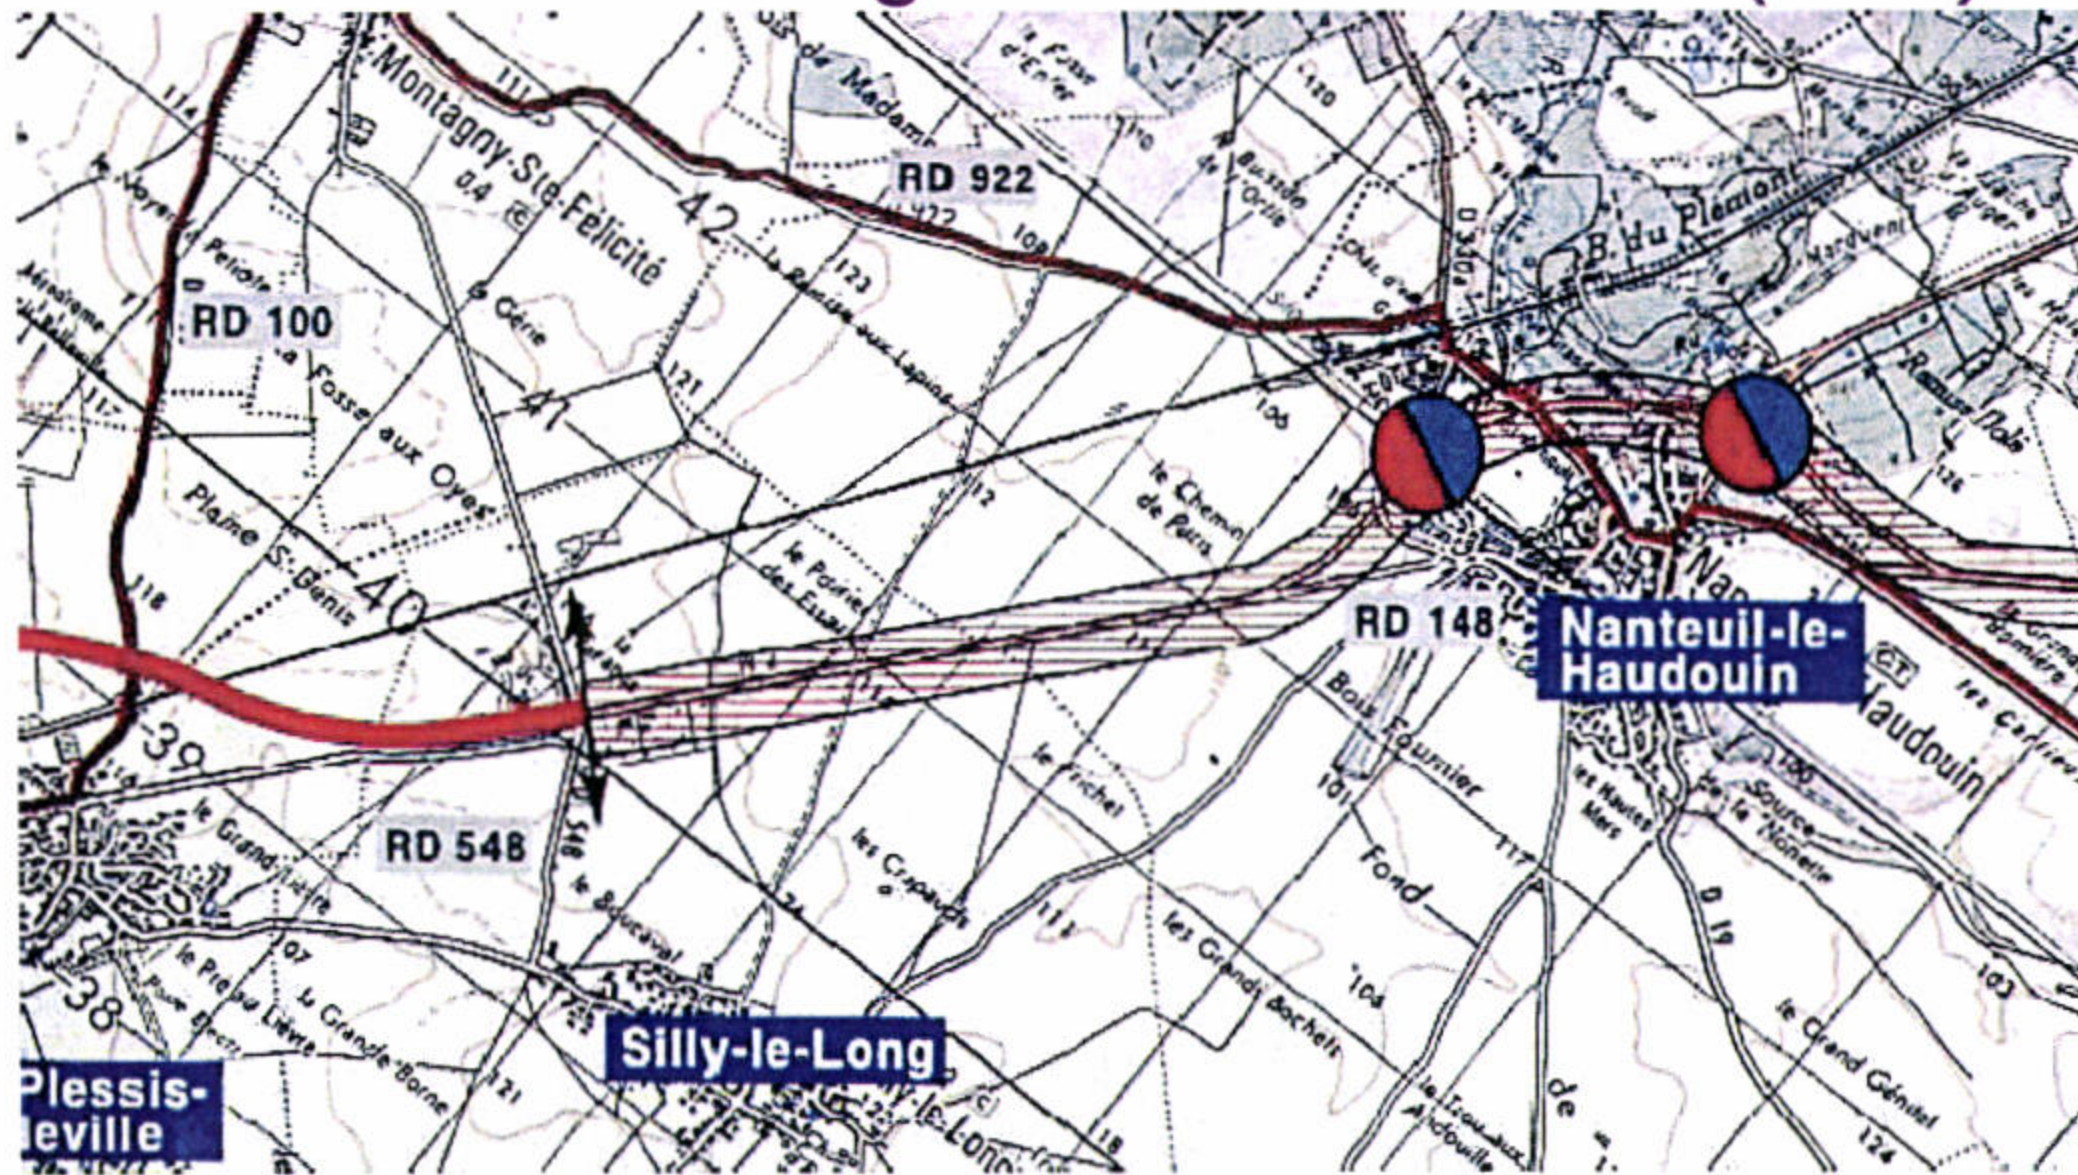

## Point d'avancement :

- Chemins latéraux de désenclavement agricole réalisés
- Ouvrage d'art de rétablissement de la RD 548 en cours
- Travaux de terrassement et chaussées en cours à Nanteuil
- Mise en service fin 2012

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Le Plessis-Nanteuil le Haudouin</b>	Etudes	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux			
<b>Déviations de Nanteuil le Haudouin</b>	Etudes	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux			Travaux
<b>Déviations de Gondreville</b>		Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	
<b>Déviations de Vaumoise</b>			Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux
<b>Déviations de Villers Cotterêts</b>			Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux
<b>Sécurisation RN2 en Forêt de Retz</b>				Travaux	Travaux	Travaux	Travaux	Travaux
<b>Maître passage faune</b>	Travaux	Travaux	Travaux					
<b>Échangeur de Cravançon</b>	Travaux	Travaux						
<b>Carrefour Escargot RD1044</b>			Travaux	Travaux	Travaux			
<i>Etudes</i>	Etudes							
<i>Travaux</i>								

Retard dans les travaux de terrassements et chaussées, lié principalement aux conditions météorologiques

# Déviations de Gondreville


**28 M€**

**Fin 2010 - 2014**



# Mise à 2 x 2 voies de la RN2 (4,5 km)

- Rétablissement VC d'Ormoy-le-Davien
- Rétablissement RF des 14 Frères
- Création passage grande faune

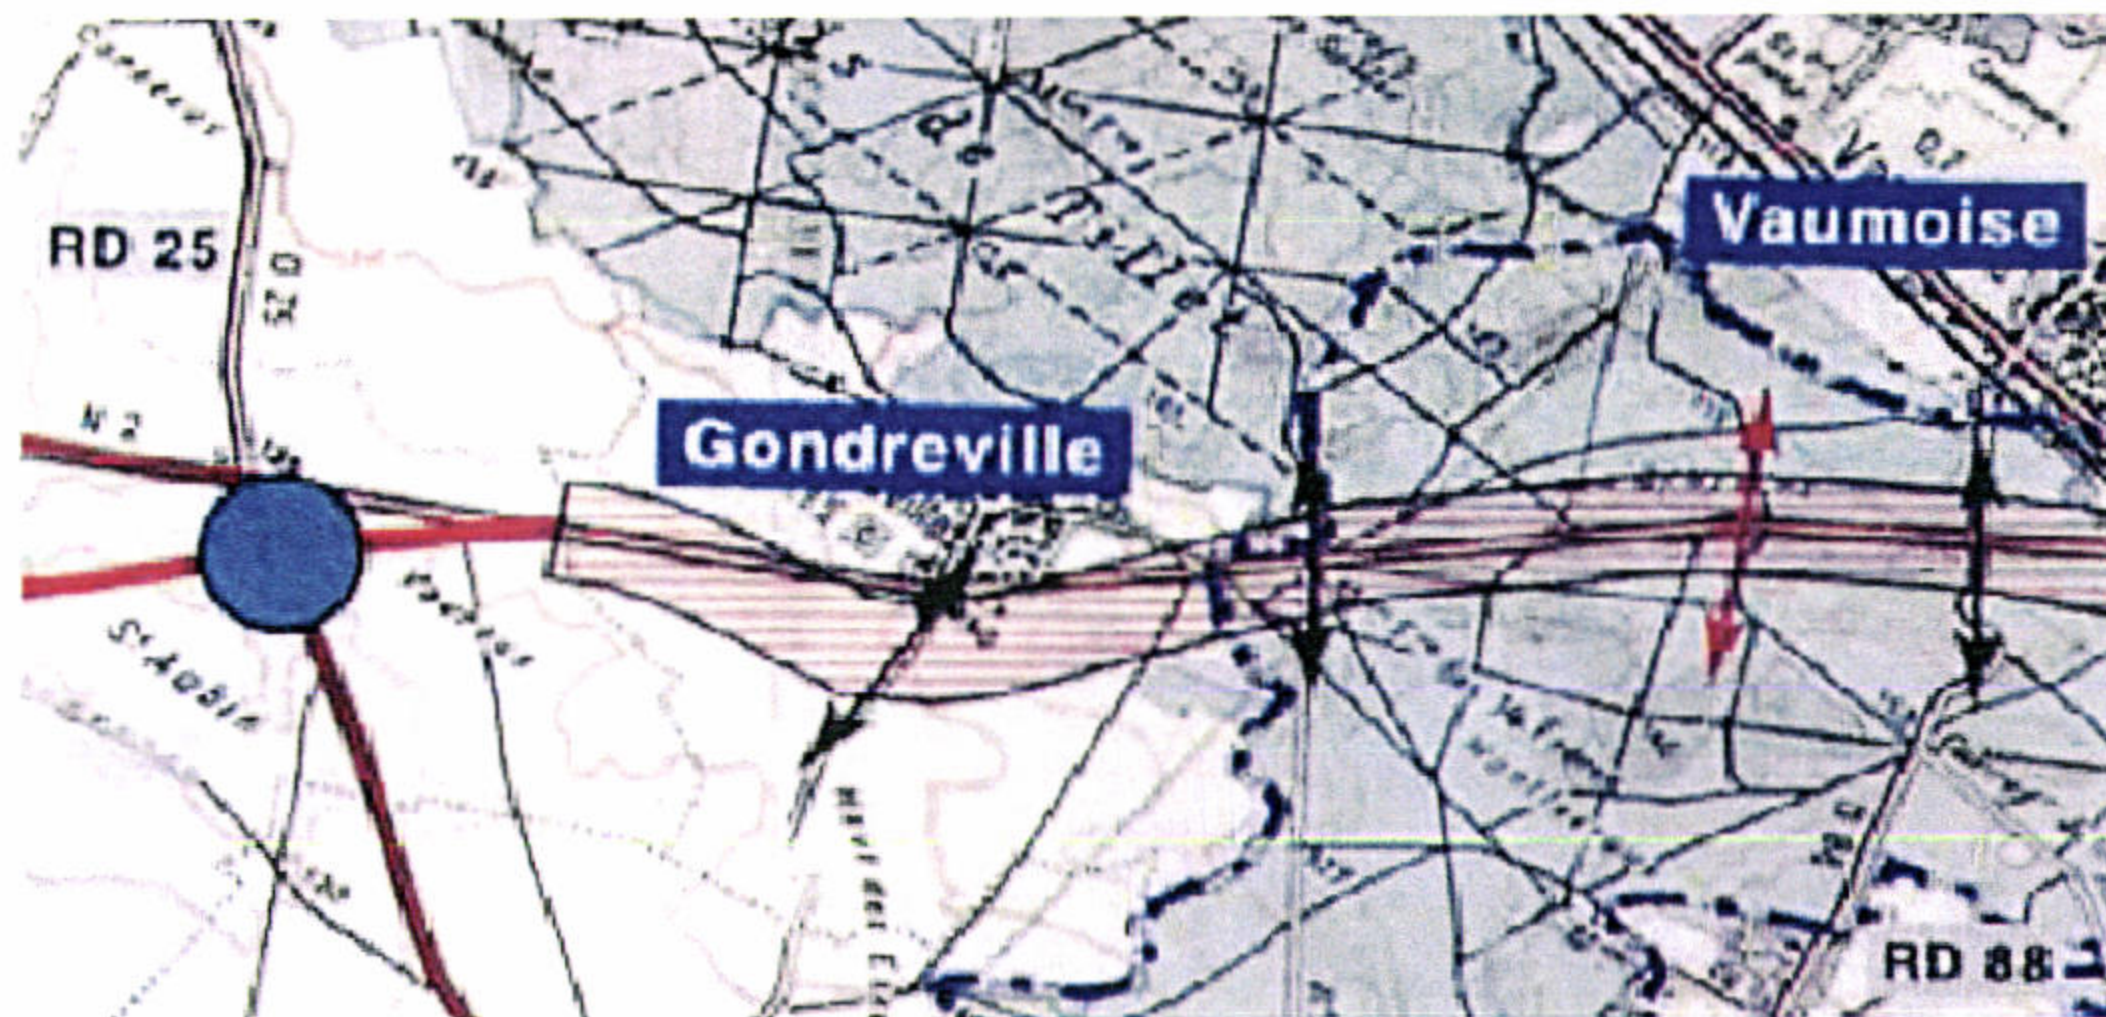

## Point d'avancement :

- Enquêtes parcellaires Oise mai 2010, Aisne juin 2010
- Enquête loi sur l'eau octobre – novembre 2010
- Diagnostic archéologique fait pour le rétablissement de la VC
- Travaux de l'ouvrage de rétablissement de la VC d'Ormoy-le-Davien mi 2011
- Mise en service 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Le Plessis-Nanteuil le Haudouin</b>								
<b>Déviaton de Nanteuil le Haudouin</b>								
<b>Déviaton de Gondreville</b>								
<b>Déviaton de Vaumoise</b>								
<b>Déviaton de Villers Cotterêts</b>								
<b>Sécurisation RN2 en Forêt de Retz</b>								
<b>Maître passage faune</b>								
<b>Échangeur de Cravançon</b>								
<b>Carrefour Escargot RD1044</b>								
<i>Etudes</i>								
<i>Travaux</i>								

Études de bioévaluation faune / flore en cours. Décalage du démarrage des travaux du à la concertation avec le ministère et l'ONF sur le tracé et attente des conclusions de l'étude de bioévaluation sur la partie en forêt. Marché de construction d'ouvrage d'art notifié.
